
UNTERNEHMENSGRUPPE
LUDWIG FREYTAG

Bei der statischen Kontrolle der Bestandskonstruktion der Rahmenbinder der Turnhalle in der Sachsenwald-Grundschule in Berlin wurde festgestellt, dass die dauerhafte Tragfähigkeit nur durch e

Verstärkung von 6 Rahmenbindern in der Sporthalle der Sachsenwald-Grundschule in Berlin



13. August 2012 – 06. September 2012

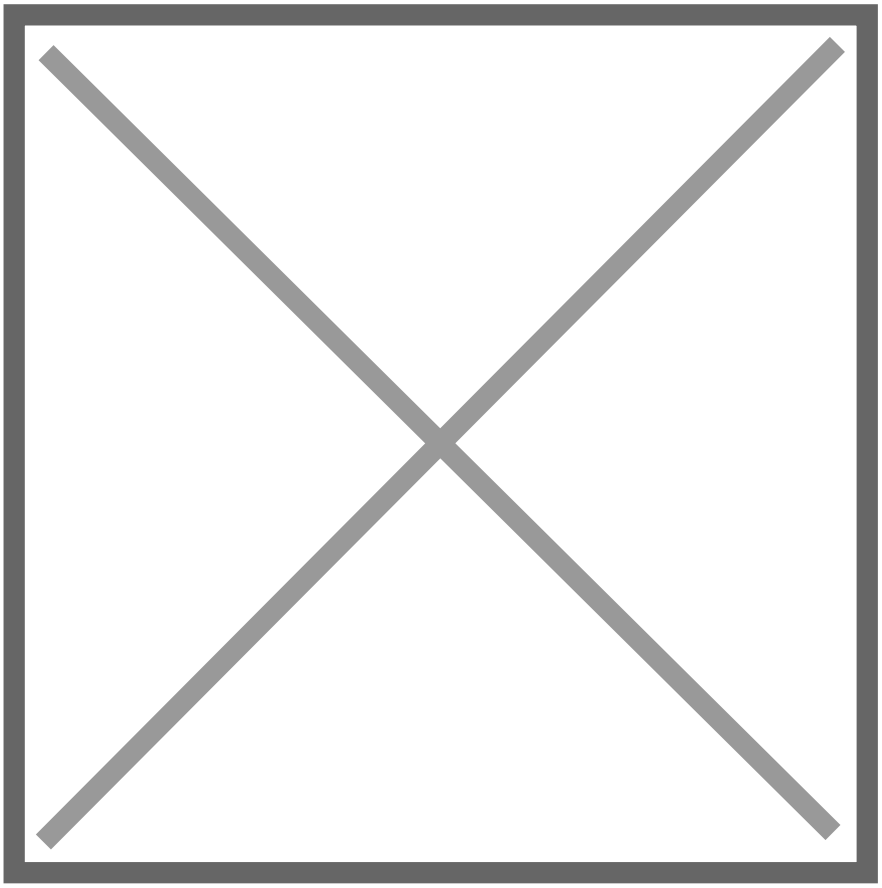

Auftraggeber	Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf von Berlin, Auf dem Graat 2, 14195 Berlin
Auftragnehmer	Ludwig Freytag GmbH & Co. Kommanditgesellschaft - Abteilung Bauwerkserhaltung/Klebearmierung - Ammerländer Heerstr. 368, 26129 Oldenburg
Eckdaten	Durch die Verstärkung ist die Standsicherheit wie vom Auftraggeber gewünscht dauerhaft sichergestellt.
Material	310,0 m S & P CFK-Lamellen 50/1,4, 200/2000 240 Stck Schubbügel aus S 235

LUDWIG FREYTAG GmbH & Co. Kommanditgesellschaft

Ammerländer Heerstraße 368 · 26129 Oldenburg

+49 441 9704-0 · info@ludwig-freytag.de
